

4. Point d'Avancement Ligne de soutien à Châtellerault

De manière générale les travaux avancent bien et les jalons sont relativement tenu avec un retard contenu de 2 semaines environ.

Illustrations avancement travaux




Clos couvert terminé hormis les prestations à réaliser après les travaux d'aménagement
 → Prochaine étape: Aménagement de la zone logistique Sud → Mise à blanc, destruction des quais et création des murs.


Ci-dessous le vous y voyez l'état d'avancement avec les différents jalons.

MASTER SCHEDULE

● Communication ▼ Jalons ■ Planning directeur ■ Avancement nominal ■ Retard

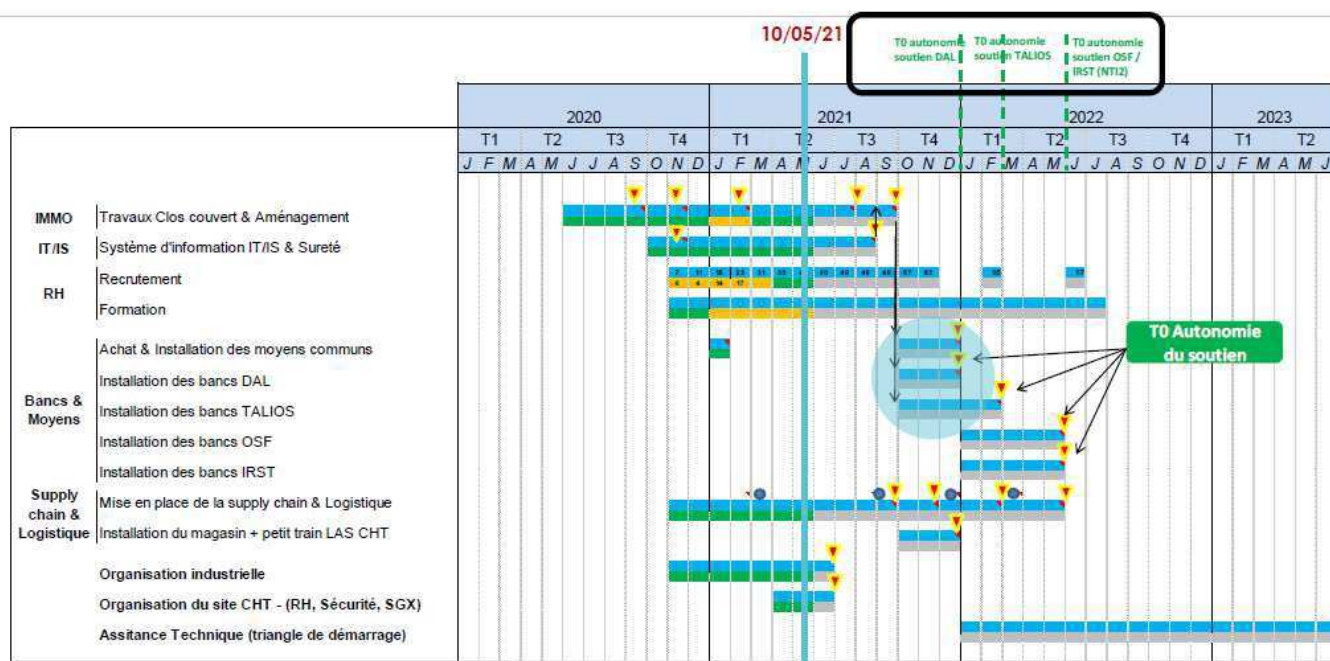

A ce jour, le planning de déménagement est prévu ainsi :

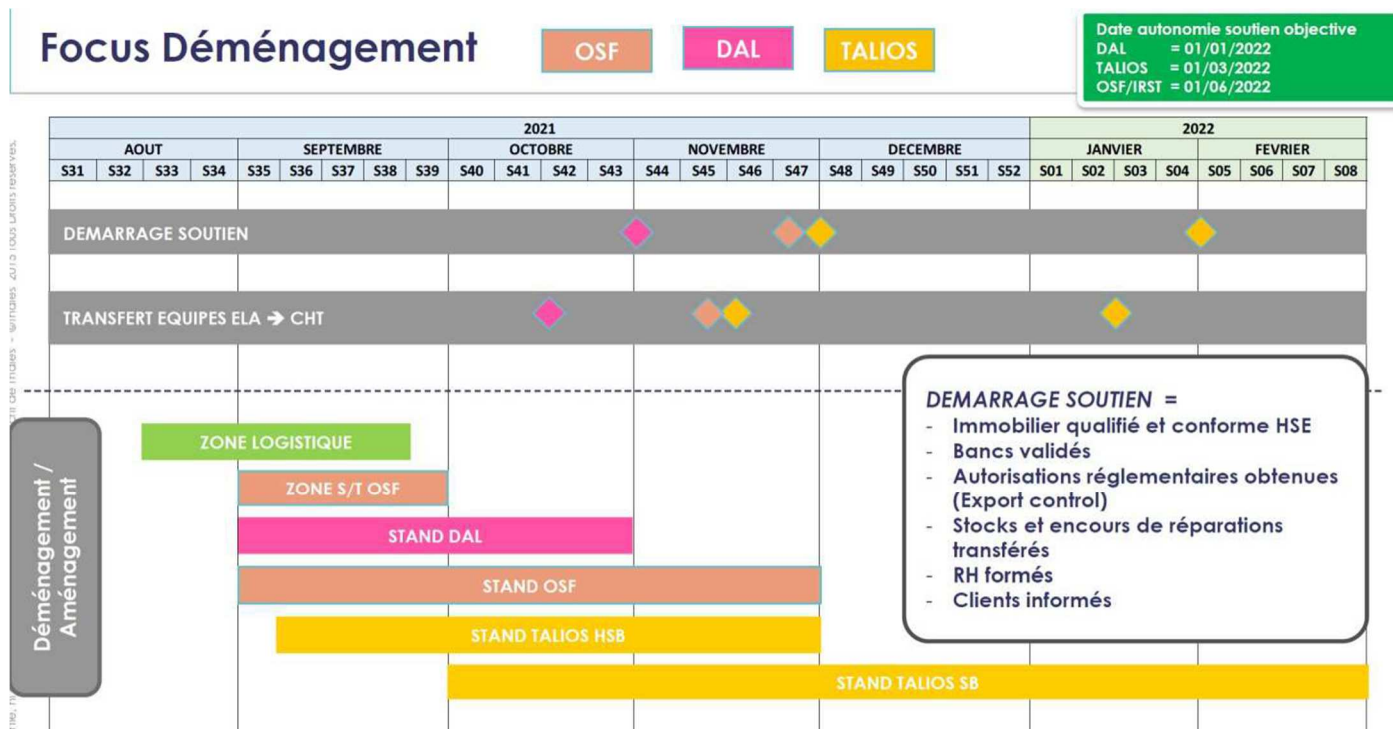

⇒ Si les délais restent respectés jusqu'à la fin de l'été les premières activités sur le site de Châtelleraut commenceront à s'implanter à la rentrée comme prévu initialement et s'étaleront jusqu'au premier semestre 2022.
